Гүйцэтгэлийн Тайлан

2026.06.10

“Таван богд” ХХК-ний оффис, үйлчилгээний барилгын
интерьерийн зураг төсөл

АГУУЛГА

1. ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ **3**

2. ТӨСЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТОЙМ МЭДЭЭЛЭЛ **3**

3. ИНТЕРЬЕРИЙН 3D-РЕНДЕР ЗУРГИЙН БҮРДЭЛ **4**

4. ИНТЕРЬЕРИЙН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН **4**


4.1 1,3,4,5-Р ДАВХРЫН ЛОББИ, НИЙТИЙН ЭЗЭМШИЛИЙН ХЭСЭГТ 5
4.2 1, 1.5-Р ДАВХРЫН ТОЁОТА, ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ 6
4.3 1, 1.5-Р ДАВХРЫН LEXUS ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАНХИМ, ЛОУНЖ 7
4.4 7, 8-Р ДАВХРЫН АМРАЛТ, СПОРТ ХЭСЭГТ 8

1. GENERAL INFORMATION
(ТӨСЛИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ)

Project title: *(Төслийн нэр)*	“ТАВАН БОГД” ХХК-ИЙН ОФФИС, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГЫН ИНТЕРЬЕРИЙН АЖЛЫН ЗУРАГ							
Client: *(Захиалагч)*	“ТАВАН БОГД” ХХК			Drawing No.: *(Зургийн шифр)*		MEC24/08		
Scope of work: *(Ажлын цар хүрээ)*	“Таван богд” ххк-ийн оффис, үйлчилгээний барилгын интерьерийн ажлын зураг							
Location: *(Байршил)*	Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо							
Director: *(Захирал)*	“ТАВАН БОГД” ХХК-ИЙН Гүйцэтгэх захирал Б.Энхсайхан			Client Project manager: *(Төслийн менежер)*		Албаны дарга Э.Цогтбат		
Discipline: *(Ажлын хэсэг)*	☐ БА	☐ ББ	☐ ХАС	☐ ЦБУ	☐ ЦАХ	☐ ХД	☐ АУ	☒ ИЗ

2. Төслийн гүйцэтгэлийн тойм мэдээлэл

НИЙТ АЖЛЫН ТОО	АЖЛЫН БҮРДЭЛ	АНГИЛСАН ХЭСЭГ	ГҮЙЦЭТГЭЛ
415	32	4	100%

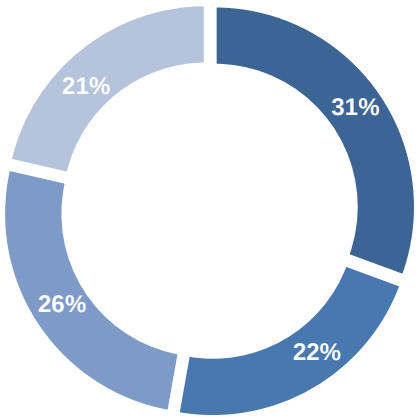

АНГИЛСАН 4 ХЭСЭГ - АЖЛЫН ТОО

- Toyota хэсэг — 127 (30.6%)
- Lexus хэсэг — 92 (22.2%)
- Оффис лобби-1,2 — 107 (25.8%)
- Спорт заал, фитнесс — 89 (21.4%)

3. Интерьерийн 3D-рендер зургийн бүрдэл

1. 1-р давхар
   - Оффис үндсэн орц-1,2.....14 хуудас
   - Ажилчдын хэсэг.....12 хуудас
   - Үйлчилгээний танхим .....10 хуудас
   - Үзэсгэлэнгийн хэсэг ..... 46 хуудас
2. 1.5-р давхар
   - LEXUS-тансаг зэрэглэлийн лоунж .....23 хуудас
   - Ажилчдын хэсэг /Хувцас солих, Шүршүүр/ .....21 хуудас
3. 2-р давхар
   - Хүүхдийн цэцэрлэгийн хэсэг .....95 хуудас
4. 3, 4, 5-р давхар
   - Ариун цэврийн өрөө /эрэгтэй, эмэгтэй/ .....11 хуудас
   - Оффис .....37 хуудас
5. 6-р давхар Оффис/хувилбар-1/ .....150 хуудас
   - Оффис/Хувилбар-2/ ..... 40 хуудас
6. 7-р давхар
   - Спорт лоунж .....52 хуудас
   - Спорт заал .....6 хуудас
7. 8-р давхар Фитнесс .....17 хуудас

Нийт .....**534 хуудас**

4. Интерьерийн Ажлын зургийн гүйцэтгэлийн тайлан

Тайлбар:

Төлөвлөж буй барилгын интерьерийн ажлын зураг нь 4 үндсэн хэсэгтэй. Үүнд:

1. 1,3,4,5-р давхрын лобби, нийтийн эзэмшил
2. 1, 1.5-р давхрын тоёота, засвар үйлчилгээний төв
3. 1, 1.5-р давхрын LEXUS үйлчилгээний танхим, лоунж
4. 7,8-р давхрын амралт, спорт хэсэг зэргээс бүрдэнэ.

Энэхүү хэсгүүдийн интерьерийн төлөвлөлт, өнгөлгөөний материал, хана, шал, тааз, гэрэлтүүлэг, цахилгааны тоног төхөөрөмж, холбоо дохиолол, тавилгын зохион байгуулалтын шийдлийг тусгасан зургийн бүрдлээс бүрдэнэ.

Дотор хана: Интерьерийн ханын шийдэл нь орон зайн зориулалт бүрт тохирсон материал, өнгө, бүтэцтэйгээр төлөвлөгдсөн.

4.1 1,3,4,5-р давхрын лобби, нийтийн эзэмшилийн хэсэгт:

Хана:

- Лобби хэсгийн дотор ханын үндсэн өнгөлгөөнд гоёлын цагаан шаргал плита /травертин/, захиалгаар хийгдэх бор хавтан / GOLDEA /, хар шил, металл оруулга , багана хэсгүүдэд бор нэвтрэлттэй акриль, далд туузан гэрэл зэргээр орон зайг төлөвлөж нийтийн эзэмшлийн өндөр ачаалалтай орчинд эдэлгээ даах нөхцөлийг бүрдүүлсэн.
- Нийтийн эзэмшлийн 3-5 давхрын коридор хэсгийн ханын өнгөлгөөнд модон хавтан /GOLDEA PVC/, цайвар шаргал хавтан / GOLDEA PVC/, бор хүрэн металл хавтан / GOLDEA PET/ ашигласан. Эдгээр хавтангууд нь ус чийгэнд тэсвэртэй, дуу шингээж дулаан хадгалдаг, хөнгөн бүтэцтэй том хэмжээтэй хавтан тул хурдан угсрагддаг.

Шал:

- Лобби хэсгийн шалны өнгөлгөөний материалд цайвар шаргал плита, бор саарал плита /ROMANTIC/ хослуулсан. Энэхүү плита нь ус чийгт тэсвэртэй удаан эдэлгээтэй бөгөөд байгалийн мэдрэмжийг төрүүлдэг.
- Нийтийн эзэмшлийн 3-5 давхрын коридор хэсгийн шалны өнгөлгөөнд дуу шингээх үүднээс бор, саарал угсардаг дрож ашиглаж, лифтний талбайд цайвар шаргал плита төлөвлөсөн.

Тааз:

- Лобби хэсгийн таазны өнгөлгөөний материалд бор чулуун будаг /TIKKURILLA/, гоёлын модон рейк ашигласан. ‘’TIKKURILLA’’ чулуун будаг нь гадаргууг жигд бүрдэг мөн дэгдэмхий органик нэгдэл багатай, дотор орчны агаарын чанарт эерэг нөлөөтэй, чийг хөгц мөөгөнцөрт тэсвэртэй төрөл бүрийн гадаргууд хэрэглэгддэг өнгөний олон сонголттой.
- Нийтийн эзэмшлийн 3-5 давхрын коридор хэсгийн таазны өнгөлгөөнд даавуун обойг шийдэж өгсөн. Ингэснээр удаан эдэлгээтэй, арчлахад хялбар, дуу шингээх чадвар өндөртэй.

Хаалга:

Барилгын дотор хаалганы шийдлийг зориулалт бүрээр нь ялган төлөвлөсөн.

- Нийтийн бүсэд шилэн хаалга ашиглаж орон зайн нээлттэй байдал, харагдах орчныг сайжруулсан.
- Ариун цэврийн өрөө болон үйлчилгээний өрөөнүүдэд чийгт тэсвэртэй хаалга ашигласан.
- Галын аюулгүй байдлын шаардлага бүхий хэсгүүдэд гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй металл хаалга төлөвлөсөн.

Тавилгын байгуулалт:

Тавилгын төлөвлөлт нь хүний урсгал хөдөлгөөн, тав тух, ашиглалтын үр ашигт тулгуурласан.

- Лобби хэсэгт тек, зөөлөн буйдан, сэтгүүлийн ширээ, ногоон ургамал бүхий амралтын бүсүүд төлөвлөсөн.

- Нийтийн эзэмшлийн 3-5 давхрын коридор хэсэгт дугуй буйдан, кофены ширээ, амрах сандал оруулсан.
- АЦӨ-ны бүх тоноглолуудыг “TOTO”- брэндээс сонгосон. Угаалтуурын тавилгад гар хатаагч суурилуулж өгснөөр үйлчлүүлэгчид тухтай шийдлийг бий болгож өгсөн.

4.2 1, 1.5-р давхрын тоёота, засвар үйлчилгээний төв:

Хана:

- 1 давхрын үйлчилгээний танхим ханын өнгөлгөөний материалд захиалгаар хийгдэх бор хавтан / GOLDEA /, модон хавтанг шийдэж өгсөн. Коридор болон ажилчдын хэсэгт даавуун хавтан, даавуун обой, ДСП хавтанг төлөвлөсөн.
- 1.5 давхрын хүлээлгийн хэсэгт даавуун хавтан /GOLDEA/, шатны хэсэгт мөнгөлөг саарал хавтан /GOLDEA PET/, амрах хэсэгт чулуун өнгөлгөөтэй хавтан, далд туузан гэрэл, цайвар шаргал даавуун хавтан, хувцас солих хэсгийн дугуй хана, арк хэлбэрийн хананд уян чулуу шийдэж өгсөн. Уян чулуу нь хөнгөн жинтэй, тээвэрлэж суурилуулахад амар, уян хатан тул дугуй хэлбэртэй гадаргууд нааж ашиглахад тохиромжтой.

Шал:

- 1 давхрын үйлчилгээний танхим, ажилчдын хэсэг, 1.5 давхрын хүлээлгийн танхим, амрах хэсгийн шалны өнгөлгөөний материалд цайвар шаргал плита, бор саарал плитаг /ROMANTIC/ хослуулсан. Энэхүү плита нь ус чийгт тэсвэртэй удаан эдэлгээтэй бөгөөд байгалийн мэдрэмжийг төрүүлдэг.

Тааз:

- 1 давхрын үйлчилгээний танхим болон хүлээлгийн хэсэгт даавуун обой, чулуун будаг, металл сараалжин тааз шийдэж өгсөн. АЦӨ-нд угаадаг цагаан эмульс төлөвлөсөн.

Хаалга:

Барилгын дотор хаалганы шийдлийг зориулалт бүрээр нь ялган төлөвлөсөн.

- Нийт хэсгүүдэд дуу тусгаарлалттай модон хаалга төлөвлөсөн.
- Ариун цэврийн өрөө болон үйлчилгээний өрөөнүүдэд чийгт тэсвэртэй хаалга ашигласан.
- Галын аюулгүй байдлын шаардлага бүхий хэсгүүдэд гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй металл хаалга төлөвлөсөн.

Тавилгын байгуулалт:

Тавилгын төлөвлөлт нь хүний урсгал хөдөлгөөн, тав тух, ашиглалтын үр ашигт тулгуурласан.

- 1-р давхрын /B ZONE/ ажилчдын хэсэгт оффис ширээ сандал, амрах буйдан, хувцасны шүүгээ төлөвлөсөн. Харин 1-р давхрын үйлчилгээний танхимд үйлчлүүлэгч хүлээхэд

тухтай ширээ сандал, зөөлөн буйдан, тек төлөвлөсөн. Борлуулах хэсэгт нь оффис ширээ сандал, ханын шүүгээ шийдэж өгсөн.

- 1.5-р давхрын хүлээлгийн хэсэгт тухтай буйдан, ширээ сандал байрлуулсан. 1.5-р давхар /D ZONE/ хувцас солих хэсэгт гутал, хувцасны шүүгээ, урт сандал, дугуй ширээ, сэнстэй угаалтуурын тавилга, алчуур тавих зориулалттай тавиур төлөвлөж өгсөн. Хурлын өрөөнд бичгийн шүүгээ, зурагт, шилэн самбар, хурлын ширээ сандал шийдсэн. Коридор хэсэгт амрах буйдан, ширээ, сандал төлөвлөж өгсөн.
- АЦӨ-ны бүх тоноглолуудыг “TOTO”- брэндээс сонгосон. Угаалтуурын тавилгад гар хатаагч суурилуулж өгснөөр үйлчлүүлэгчид тухтай шийдлийг бий болгож өгсөн.

4.3 1, 1.5-р давхрын LEXUS үйлчилгээний танхим, лоунж:

Хана:

- 1 давхрын үйлчилгээний танхимын ханын өнгөлгөөний материалд захиалгаар хийгдэх хүрэн бор хавтан
  /GOLDEA/, модон хавтан, арьсан гоёлын хавтан, хар шил, лед дэлгэц шийдэж өгсөн. Борлуулалтын өрөөнд цагаан шаргал хавтан /GOLDEA PVC/, АЦӨ-нд ус чийгт тэсвэртэй модон хавтан /GOLDEA/, гоёлын хар плита, цагаан шаргал плитаг төлөвлөсөн.
- 1.5 давхрын лоунж хэсгийн ханын өнгөлгөөний материалд модон хавтан /FUNDERMAX HPL/, арьсан гоёлын хавтан, хар шил, цагаан шаргал плита, дугуй баганад чулуун мозайк, лого байршуулах гэрэлтэй хананд захиалгаар хийгдэх гоёлын хөнгөн цагаан хавтан, зүсэлттэй хавтан /CNC/ шийдсэн. “FUNDERMAX”-ийн хавтан нь хэт ягаан туяа, гал, ус чийг, зураас, цохилт, механик ачаалалд тэсвэр сайтай, арчилгаа бага шаарддаг, дизайны өргөн сонголттой, суурилуулалт хурдан, байгаль орчинд ээлтэй. Оффис хэсэгт даавуун хавтан, модон хавтан /GOLDEA PVC/ хавтанг төлөвлөж өгсөн. Коридор хэсэгт дуу шингээх, дулаан орчин бүрдүүлэх үүднээс даавуун обойг төлөвлөсөн.

Шал:

- 1 давхрын үйлчилгээний танхимын шалны өнгөлгөөний материалд цайвар шаргал плита, бор саарал плитаг /ROMANTIC/ хослуулсан. Энэхүү плита нь ус чийгт тэсвэртэй удаан эдэлгээтэй бөгөөд байгалийн мэдрэмжийг төрүүлдэг. Борлуулалтын өрөөнд угсардаг дрож /ROMANTIC/ шийдэж өгсөн.
- 1.5 давхрын лоунж хэсгийн шалны өнгөлгөөний материалд LEXUS-ийн логотой дрож захиалгаар, цайвар шаргал плита төлөвлөсөн.

Тааз:

1 давхрын үйлчилгээний танхимын таазны өнгөлгөөний материалд даавуун обой, металл сараалжин тааз, хар рейкэн тааз, уян тааз шийдсэн. 1.5 давхрын таазны өнгөлгөөний материалд LEXUS-ийн хээтэй уян тааз, даавуун обой, цагаан эмульс төлөвлөсөн.

Хаалга:

Барилгын дотор хаалганы шийдлийг зориулалт бүрээр нь ялган төлөвлөсөн.

- Нийт хэсгүүдэд дуу тусгаарлалттай модон хаалга, шилэн хаалга төлөвлөсөн.

- Ариун цэврийн өрөө болон үйлчилгээний өрөөнүүдэд чийгэнд тэсвэртэй хаалга ашигласан.
- Галын аюулгүй байдлын шаардлага бүхий хэсгүүдэд гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй металл хаалга төлөвлөсөн.

Тавилгын байгуулалт:

Тавилгын төлөвлөлт нь хүний урсгал хөдөлгөөн, тав тух, ашиглалтын үр ашигт тулгуурласан.

- 1-р давхрын үйлчилгээний танхим, борлуулалтын хэсэгт оффис ширээ сандал, бичгийн шүүгээ, харилцагчид зориулсан зөөлөн сандал төлөвлөсөн.
- 1.5-р давхрын лоунж хэсэгт эргэдэг дугуй ширээ, сандал," LEXUS"- логотой зүсэлттэй ширээ, дугуй буйдан, тек, массажны сандал байршуулж ажилчдын хэсэгт оффис ширээ сандал, буйдан, хувцасны шүүгээ зэргийг хийсэн.
- АЦӨ-ны бүх тоноглолуудыг "TOTO"- брэндээс сонгосон. Угаалтуурын тавилгад гар хатаагч суурилуулж өгснөөр үйлчлүүлэгчид тухтай шийдлийг бий болгож өгсөн.

4.4 7, 8-р давхрын амралт, спорт хэсэгт:

Хана:

- 7-р давхрын /A ZONE/ спорт заал хэсгийн ханын өнгөлгөөний материалд дуу шингээх зориулалтаар гоёлын модон хавтан /GOLDEA PVC/, даавуун хавтан /GOLDEA PVC/, цагаан эмульс шийдэж өгсөн. 7-р давхрын /B ZONE/ жүүс баар хэсгийн ханын өнгөлгөөний материалд гоёлын модон хавтан, цайвар шаргал даавуун хавтан /GOLDEA PVC/, чулуун будаг /TIKKURILLA/, гоёлын нерж оруулсан. Тамирчдын хувцас солих өрөө болон нийт хувцас солих өрөөний хэсгүүдэд плита /ROMANTIC-ELISABETH/ шийдсэнээс гадна гэрэлтэй металл сараалжин ханыг оруулж өгсөн. Сауны өрөөнд ус чийгийн хамгаалалттай хуш модон рейк, шаргал плита төлөвлөсөн.
- 8-р давхрын фитнес заалны ханын өнгөлгөөний материалд саарал чулуун будаг /TIKKURILLA/, гоёлын бор хавтан /GOLDEA/ захиалгаар хийгдэх, толь зэргийг шийдэж өгсөн.

Шал:

- 7-р давхрын /A ZONE/ спорт заал хэсгийн шалны өнгөлгөөний материалд агч модон шал шийдэж өгсөн. Агч модон шал нь угсрагдах зориулалттай зааланд зохиогдох спортын төрлөөс хамаарч өөрчлөх боломжтой юм.
- 7-р давхрын /B ZONE/ жүүс баарны шалны өнгөлгөөний материалд паркет /EGGER/, дрож бусад хэсгүүдэд саарал плита /TOP CERAMICS/ шийдэж өгсөн. Багшийн өрөө, эмчийн өрөөнд паркет төлөвлөсөн.
- 8-р давхрын фитнес заалны шалны өнгөлгөөний материалд паркет болон угсардаг резинэн шал шийдсэн.

Тааз:

- 7-р давхрын /A ZONE/ спорт заал хэсгийн таазны өнгөлгөөний саарал эмульс, модон өнгөлгөөтэй рейк /ДСП/ оруулсан.
- 7-р давхрын /B ZONE/ жүүс баарны хэсгийн таазны өнгөлгөөний материалд хулсан хавтан, даавуун обой, модон рейкэн тааз, угаадаг цагаан эмульс зэргийг шийдэж өгсөн.
- 8-р давхрын фитнес заалны таазны өнгөлгөөний материалд чулуун будаг /TIKKURILLA/, металл сараалжин тааз, даавуун обой, угаадаг эмульс орсон.

Хаалга:

Барилгын дотор хаалганы шийдлийг зориулалт бүрээр нь ялган төлөвлөсөн.

- Нийт хэсгүүдэд дуу тусгаарлалттай модон хаалга төлөвлөсөн.
- Ариун цэврийн өрөө болон үйлчилгээний өрөөнүүдэд чийгт тэсвэртэй хаалга ашигласан.
- Галын аюулгүй байдлын шаардлага бүхий хэсгүүдэд гал тэсвэрлэлтийн зэрэглэлтэй металл хаалга төлөвлөсөн.


Тавилгын байгуулалт:

Тавилгын төлөвлөлт нь хүний урсгал хөдөлгөөн, тав тух, ашиглалтын үр ашигт тулгуурласан.


- 7-р давхрын /A ZONE/ спорт заал хэсэгт үзэгчдийн сандал, оноо харуулах дэлгэц суурилуулж, /B ZONE/ жүүс баарны хэсэгт тек, зөөлөн буйдан, сандал, ширээ, зурагт байрлуулсан. Хувцас солих хэсэгт шүүгээ, угаалтуур, урт сандал зэргийг төлөвлөсөн. Багш болон эмчийн өрөөнд ажлын ширээ, сандал, үзлэгийн ор, шүүгээ шийдсэн.
- 8-р давхрын фитнес заалд дасгалын тоног төхөөрөмж, боксын ринг, тек, амрах буйдан, дасгалжуулагчийн өрөөнд ажл сандал ширээ, шүүгээ төлөвлөсөн.
- АЦӨ-ны бүх тоноглолуудыг “TOTO”- брэндээс сонгосон. Угаалтуурын тавилгад гар хатаагч суурилуулж өгснөөр үйлчлүүлэгчид тухтай шийдлийг бий болгож өгсөн.


Интерьерийн иж бүрэн ажлын зургийн гүйцэтгэл:


Нийт дөрвөн хэсгийн хана, шал, тааз, тавилгын модель хийгдсэн. Ажлын зургийн үндсэн зургийн бүрдэл зурагдсан.

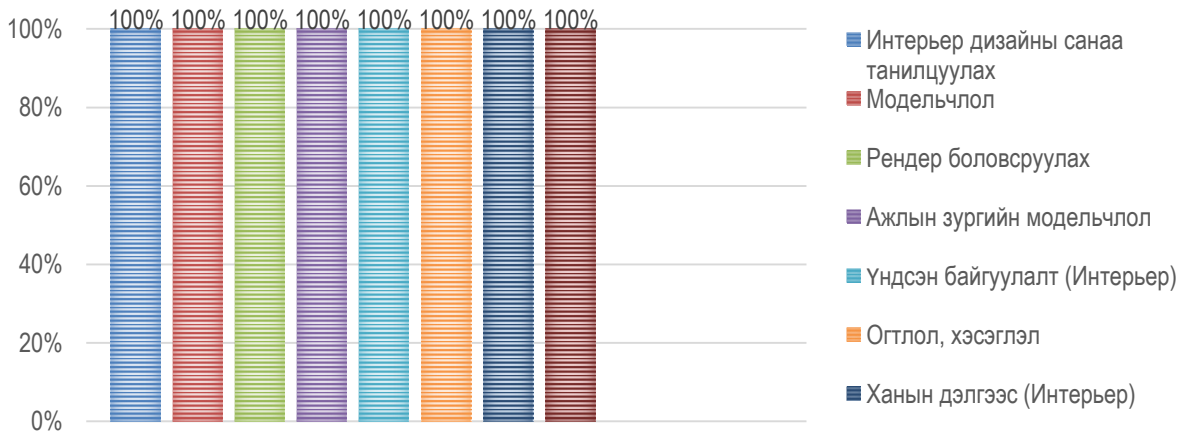



/Ажлын зургийн бүрдлийг доорх зурагнаас үзнэ үү./

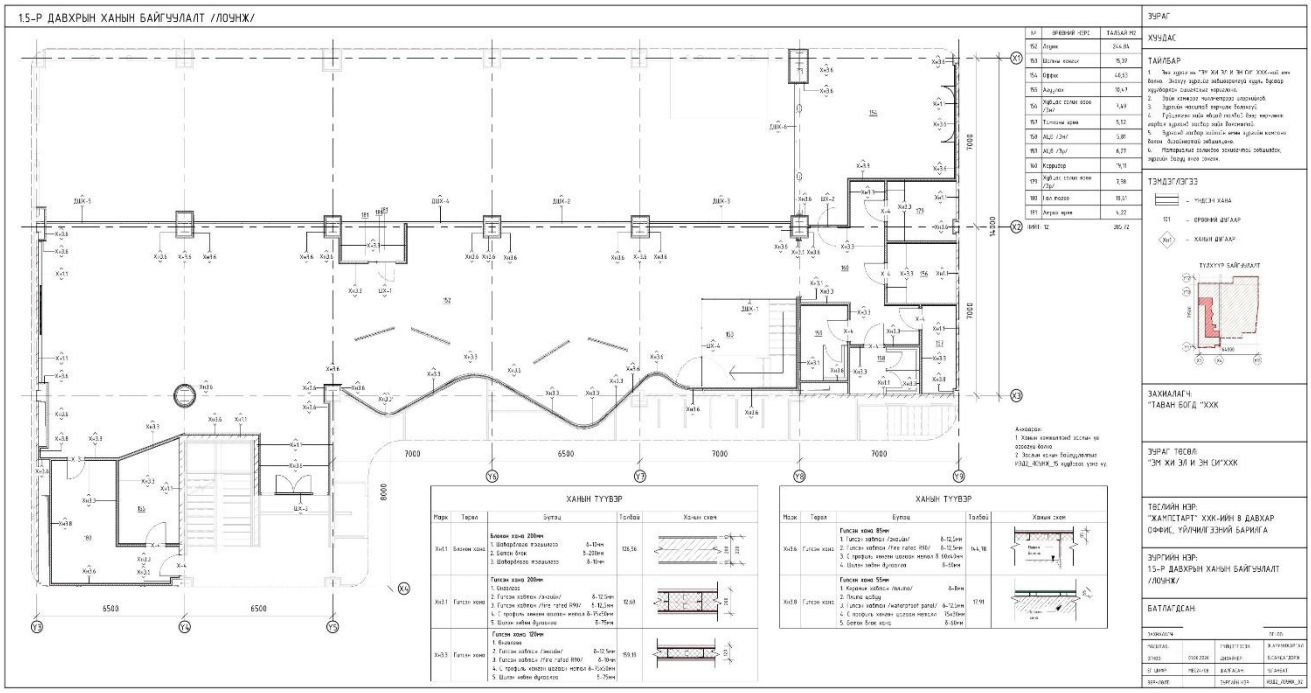

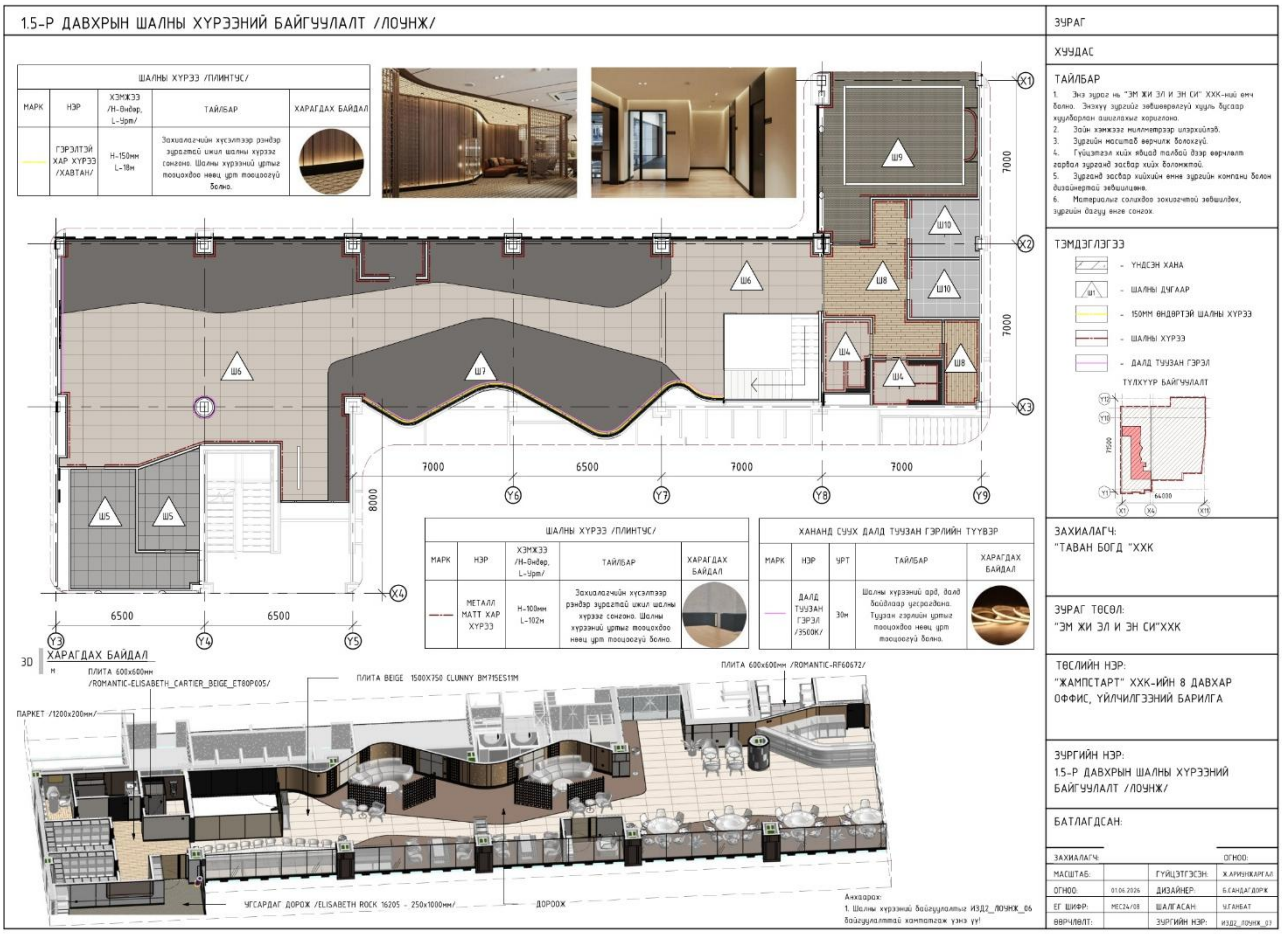
1.5-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТ /ЛОУНЖ/
ЗУРАГ
ХУУДАС
ТАЙЛБАР
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
ЗАХИАЛАГЧ:
"ТАВАН БОГД "ХХК
ЗУРАГ ТӨСӨЛ:
"ЭМ ЖИ ЭЛ И ЭН СИ"ХХК
ТӨСЛИЙН НЭР:
"ЖАМПСТАРТ" ХХК-ИЙН 8 ДАВХАР ОФФИС, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
ЗУРГИЙН НЭР:
1.5-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ ХҮРЭЭНИЙ БАЙГУУЛАЛТ /ЛОУНЖ/
БАТЛАГДСАН:
ШАЛНЫ ХҮРЭЭ /ПЛИНТУС/
ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
ХАНАНД СУУХ ДАЛД ТУУЗАН ГЭРЛИЙН ТҮҮВЭР
ПАРКЕТ /1200x200мм/
ПЛИТА 600x600мм /ROMANTIC-ELISABETH_CARTIER_BEIGE_ET80P005/
ПЛИТА BEIGE 1500X750 CLUNNY BM75ES11M
ПЛИТА 600x600мм /ROMANTIC-RF60572/
ЧИГЗАРДАГ ДОРОЖ /ELISABETH ROCK 16205 - 250x1000мм/
ДОРОЖ

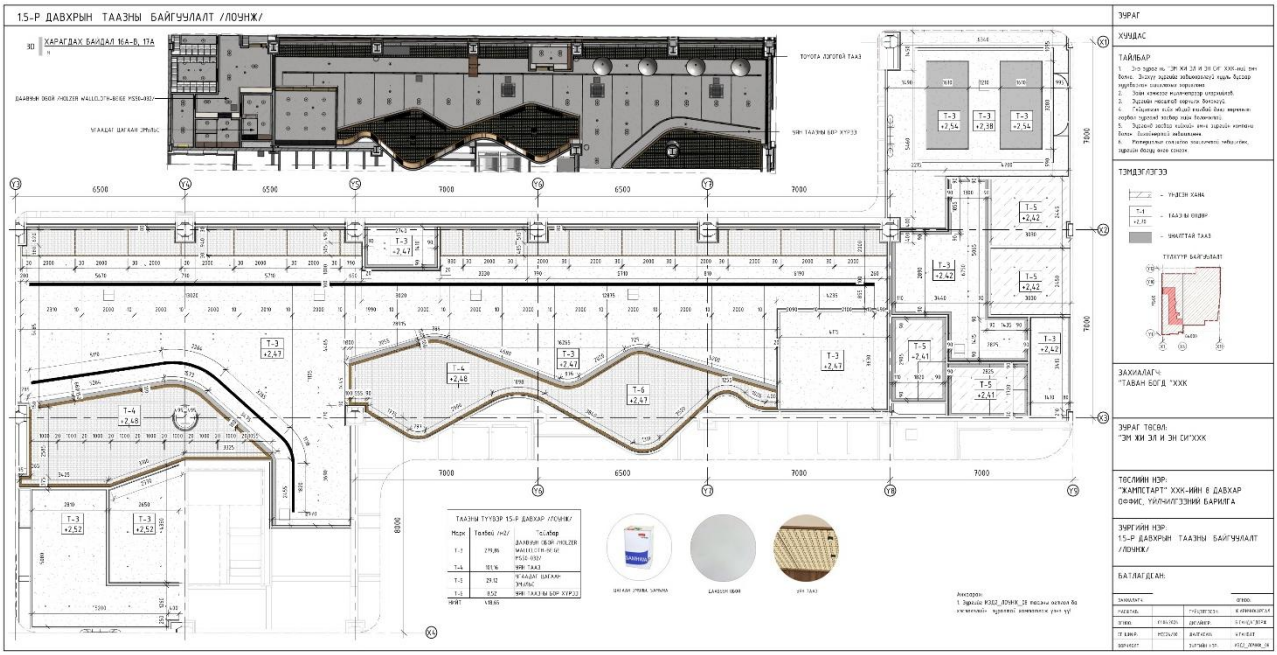

1.5-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ /ЛОУНЖ/
ХАРАГДАХ БАЙДАЛ 16А-Б, 17А
ЗУРАГ
ХУУДАС
ТАЙЛБАР
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
ЗАХИАЛАГЧ:
"ТАВАН БОГД "ХХК
ЗУРАГ ТӨСӨЛ:
"ЭМ ЖИ ЭЛ И ЭН СИ"ХХК
ТӨСЛИЙН НЭР:
"ЖАМПСТАРТ" ХХК-ИЙН 8 ДАВХАР ОФФИС, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
ЗУРГИЙН НЭР:
1.5-Р ДАВХРЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ /ЛОУНЖ/
БАТЛАГДСАН:

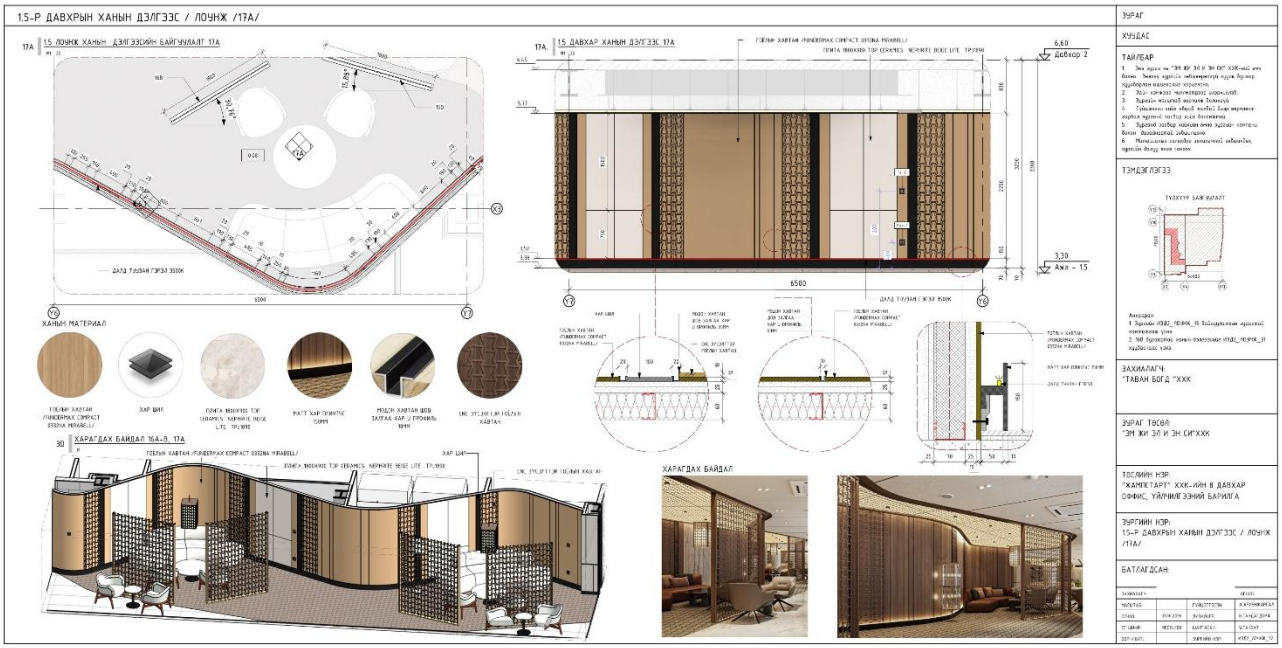

1.5-Р ДАВХРЫН ХАНЫН ДЭЛГЭЭС / ЛОУНЖ /17А/
ЗУРАГ
ХУУДАС
ТАЙЛБАР
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
ЗАХИАЛАГЧ:
"ТАВАН БОГД "ХХК
ЗУРАГ ТӨСӨЛ:
"ЭМ ЖИ ЭЙ И ЭН СИГХХК
ТӨСЛИЙН НЭР:
"ХАМПСТАРТ" ХХК-ИЙН 8 ДАВХАР ОФФИС, УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
ЗУРГИЙН НЭР:
1.5-Р ДАВХРЫН ХАНЫН ДЭЛГЭЭС / ЛОУНЖ /17А/
БАТЛАГДСАН:

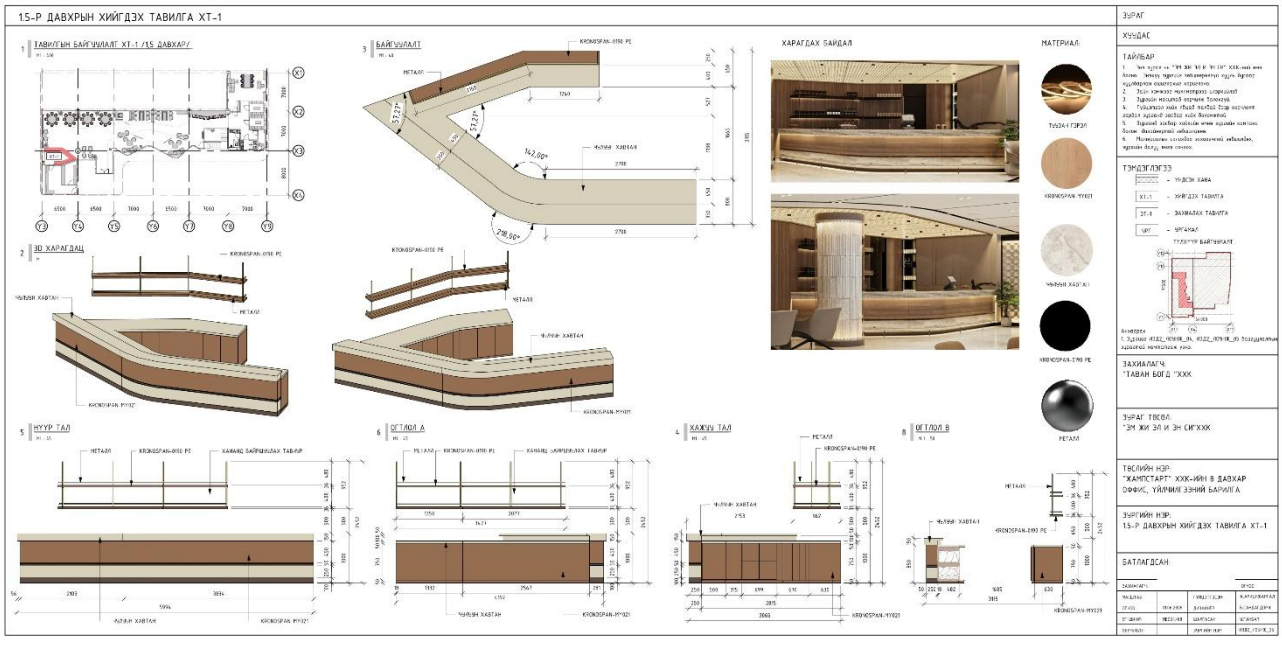
1.5-Р ДАВХРЫН ХИЙГДЭХ ТАВИЛГА ХТ-1
ЗУРАГ
ХУУДАС
ТАЙЛБАР
ТЭМДЭГЛЭГЭЭ
ЗАХИАЛАГЧ:
"ТАВАН БОГД "ХХК
ЗУРАГ ТӨСӨЛ:
"ЭМ ЖИ ЭЙ И ЭН СИГХХК
ТӨСЛИЙН НЭР:
"ХАМПСТАРТ" ХХК-ИЙН 8 ДАВХАР ОФФИС, УЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРИЛГА
ЗУРГИЙН НЭР:
1.5-Р ДАВХРЫН ХИЙГДЭХ ТАВИЛГА ХТ-1
БАТЛАГДСАН:

3D РЕНДЕР ЗУРАГ:


1-р давхар

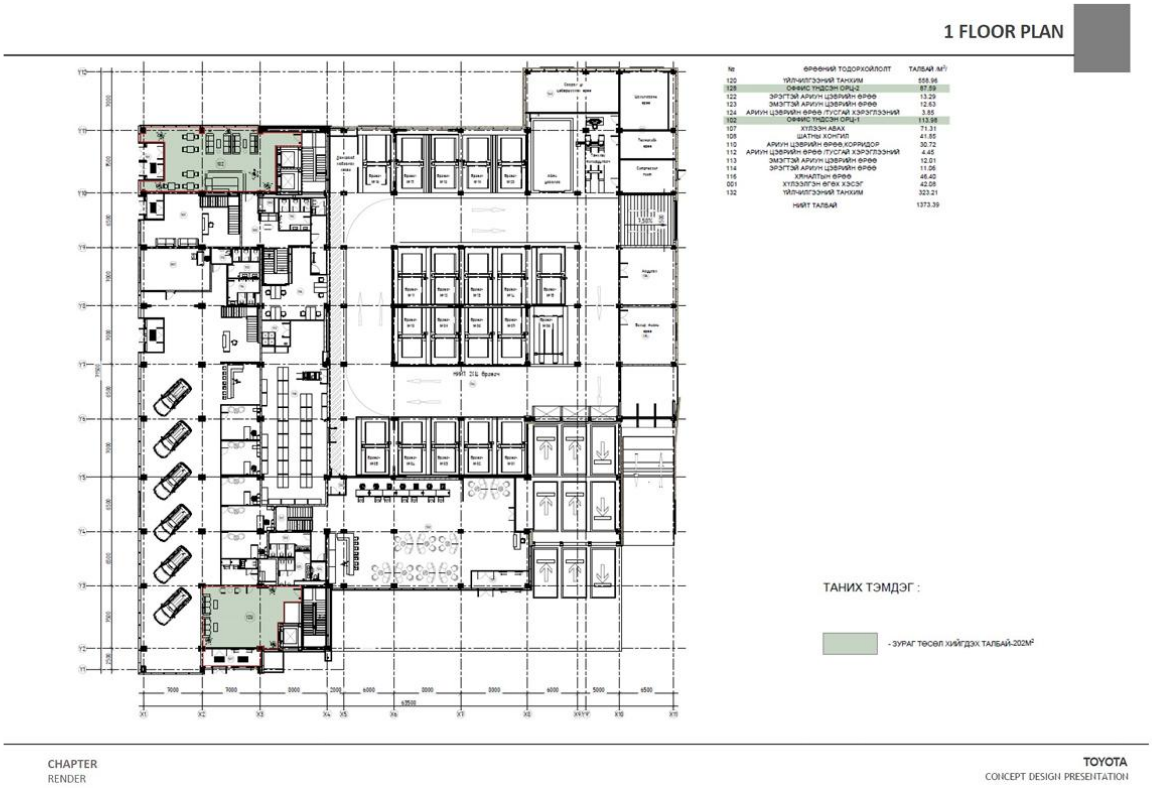


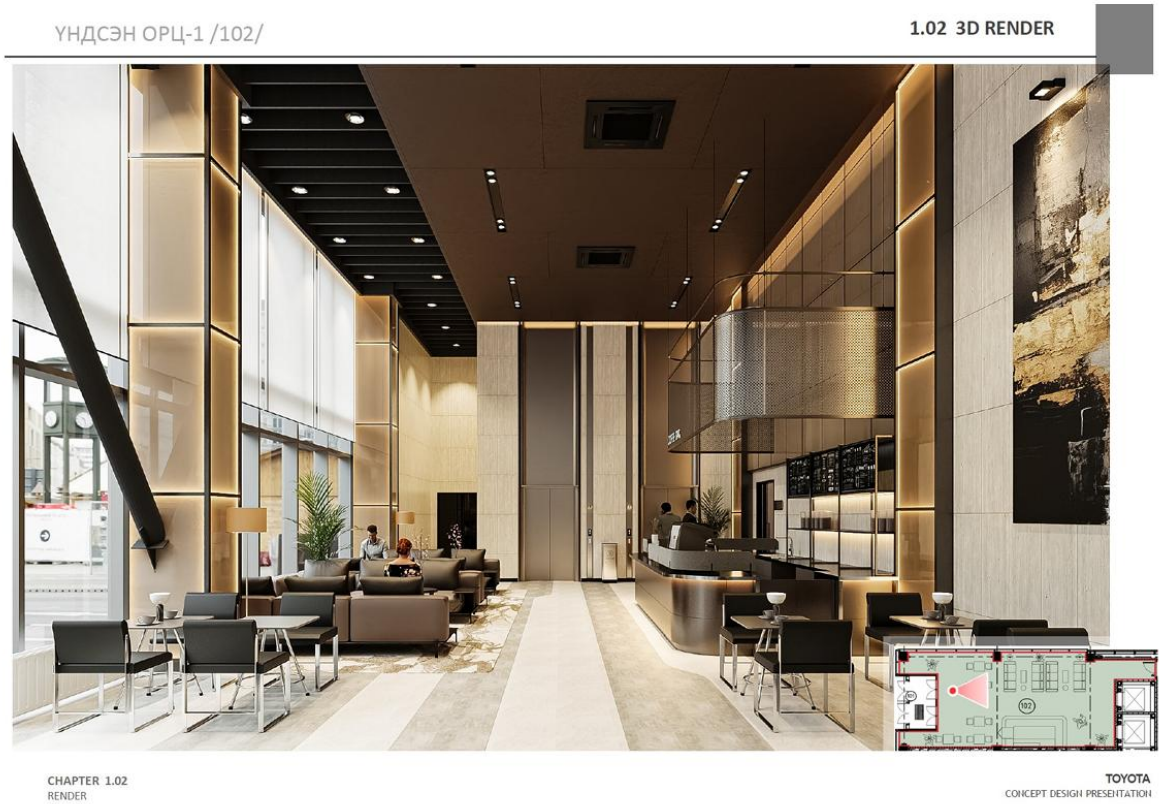

3D РЕНДЕР ЗУРАГ:


1-р давхар

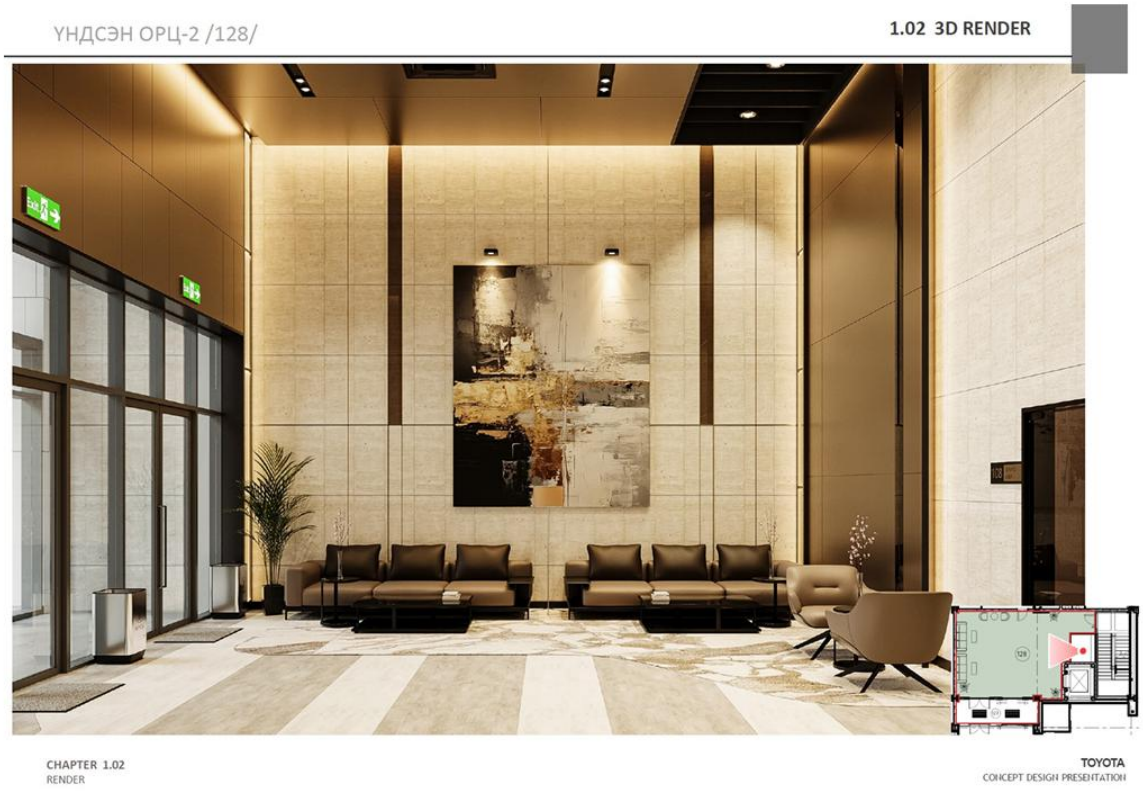


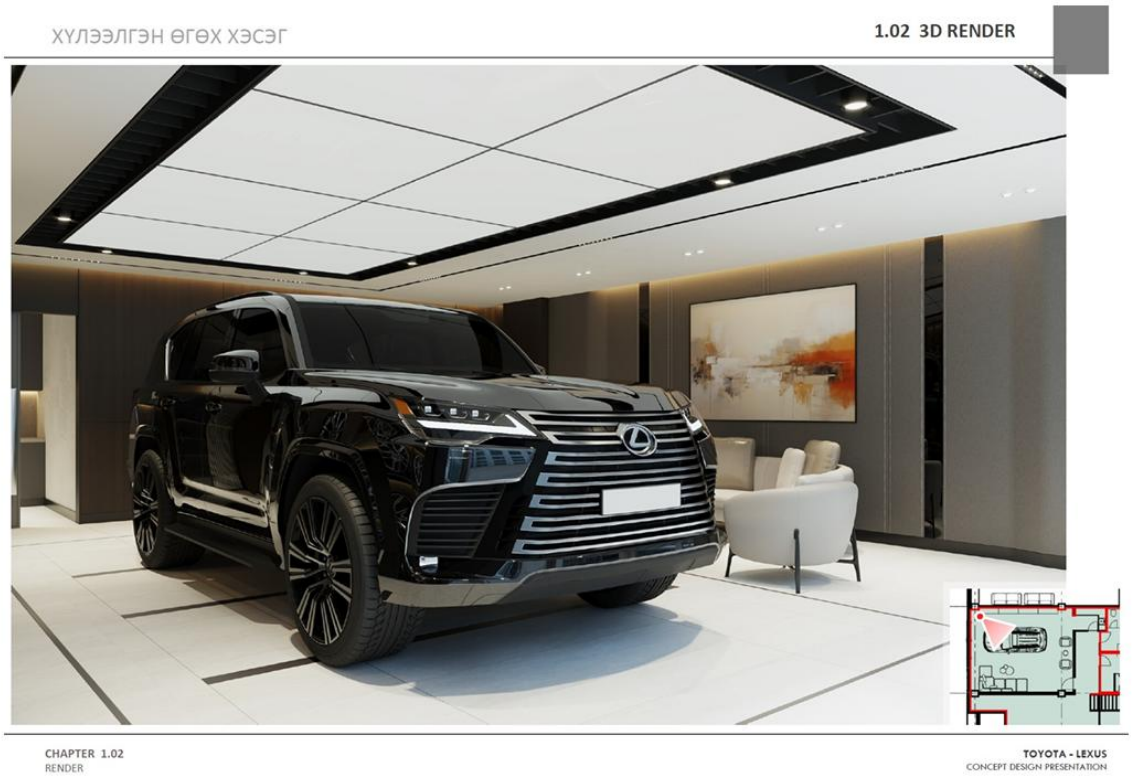

3D РЕНДЕР ЗУРАГ:


1-р давхар

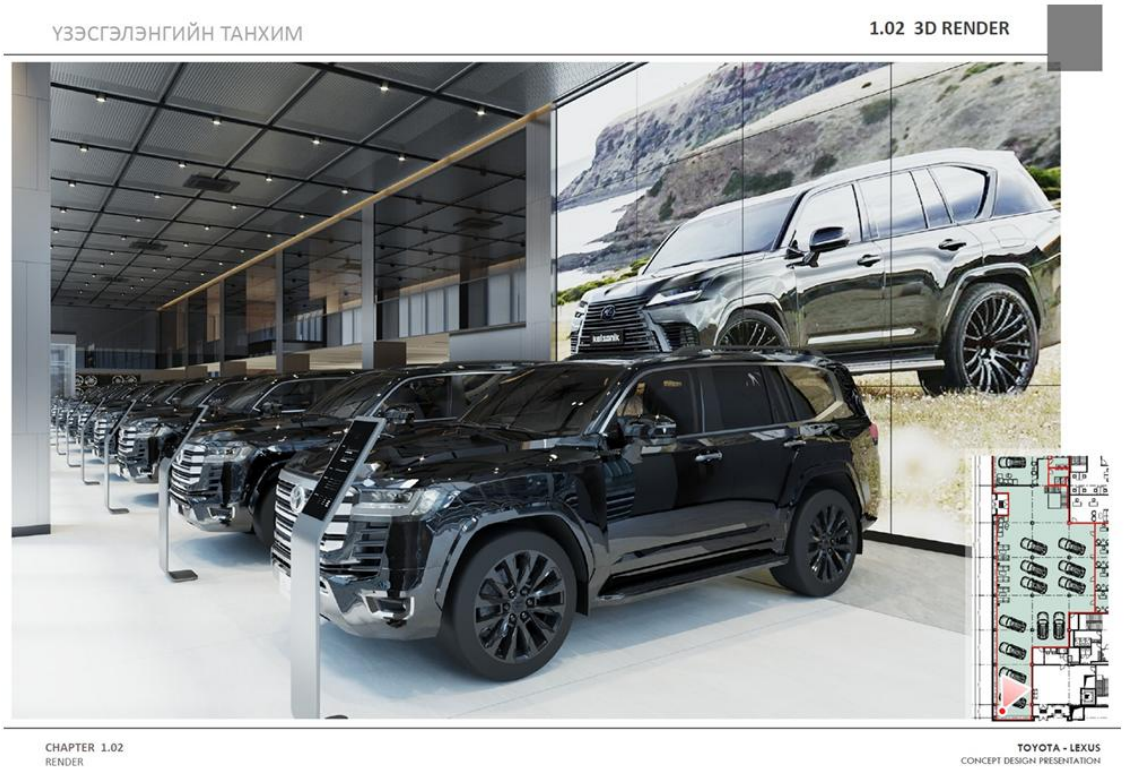

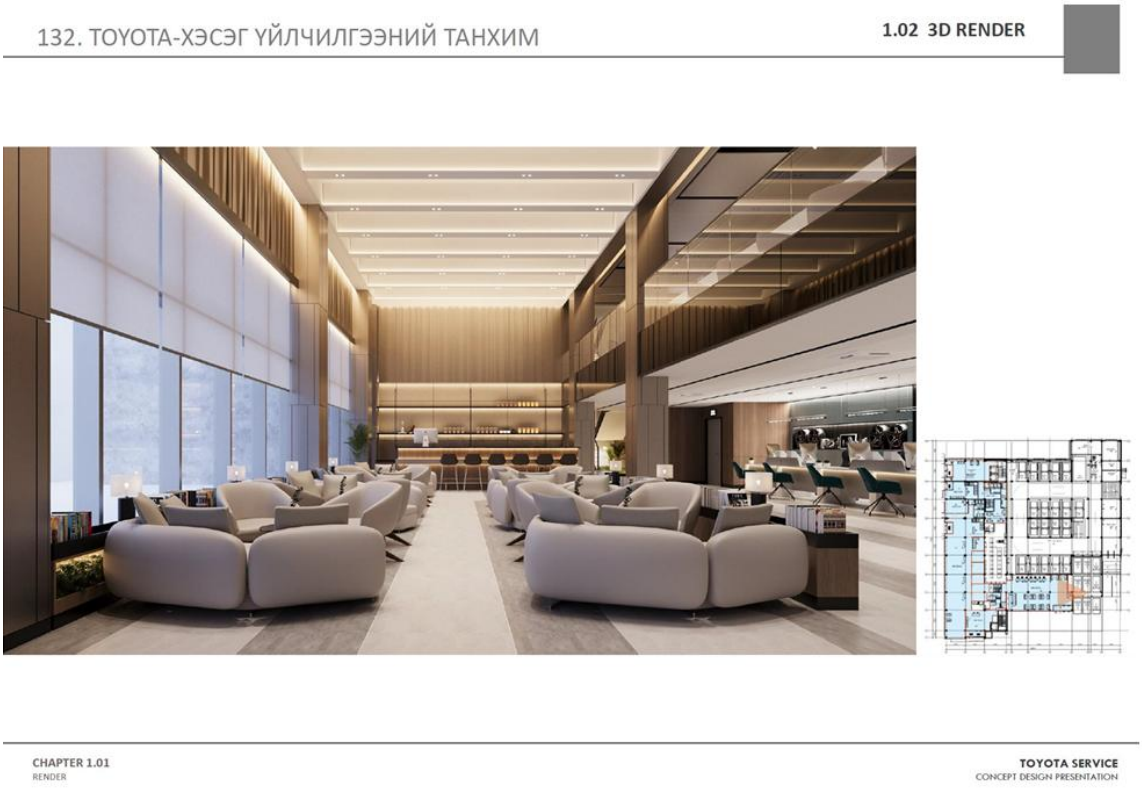


3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

1-р давхар

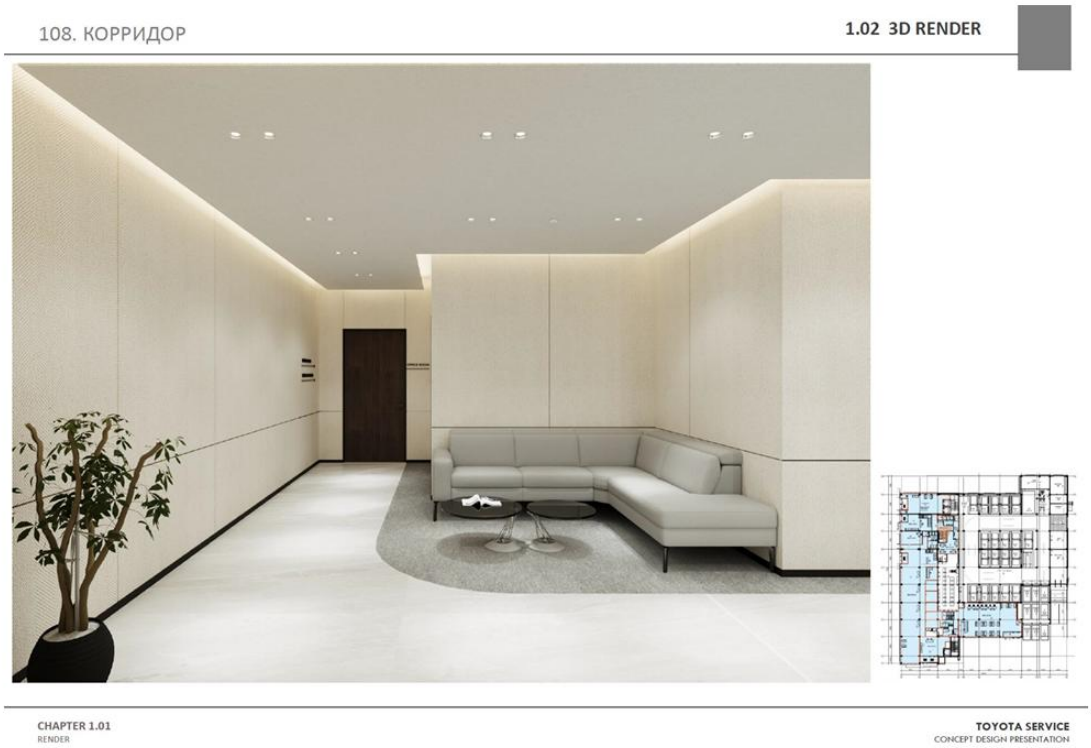

3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

1.5-р давхар

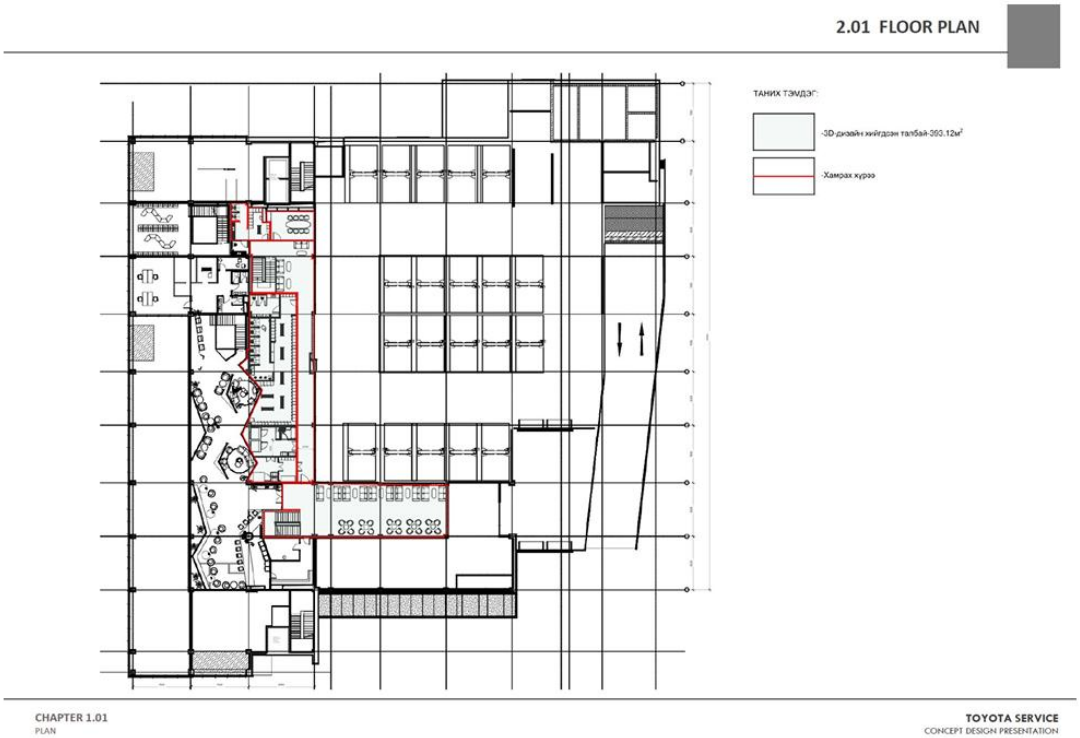

159, 171. АМРАЛТЫН ХЭСЭГ, КОРРИДОР

2.02 3D RENDER






ХУВЦАС СОЛИХ ӨРӨӨ

1,5.02 3D RENDER





160-163. ЭРЭГТЭЙ ХУВЦАС СОЛИХ ХЭСЭГ

2.02 3D RENDER





CHAPTER 1.01
RENDER

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

ЛОУНЖ

1,5.02 3D RENDER






CHAPTER 1,5.02
RENDER

TOYOTA - LEXUS
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

2-р давхар

3.01 FLOOR PLAN

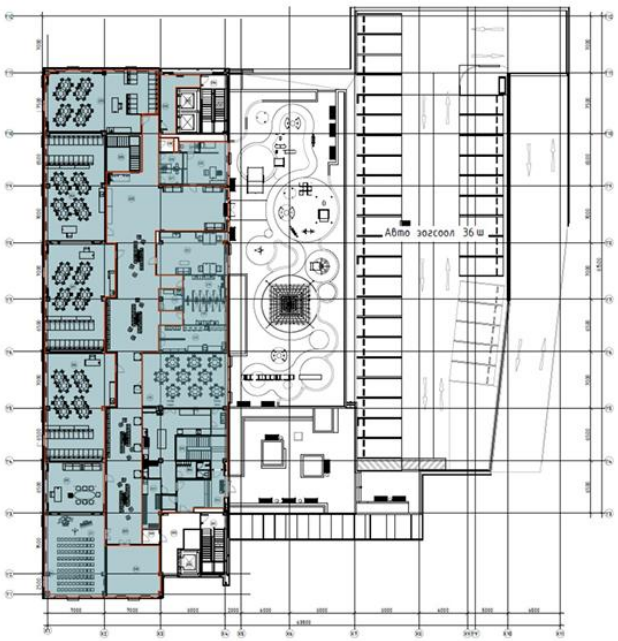

CHAPTER 3.01
PLAN

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

107. ХҮЛЭЭН АВАХ /ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ/

1.02 3D RENDER





CHAPTER 1.01
RENDER

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

223. КОРРИДОР

3.02 3D RENDER





223. КОРРИДОР

3.02 3D RENDER





223. КОРРИДОР

3.02 3D RENDER





231. АНГИ


3.02 3D RENDER






3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

3-5-р давхар

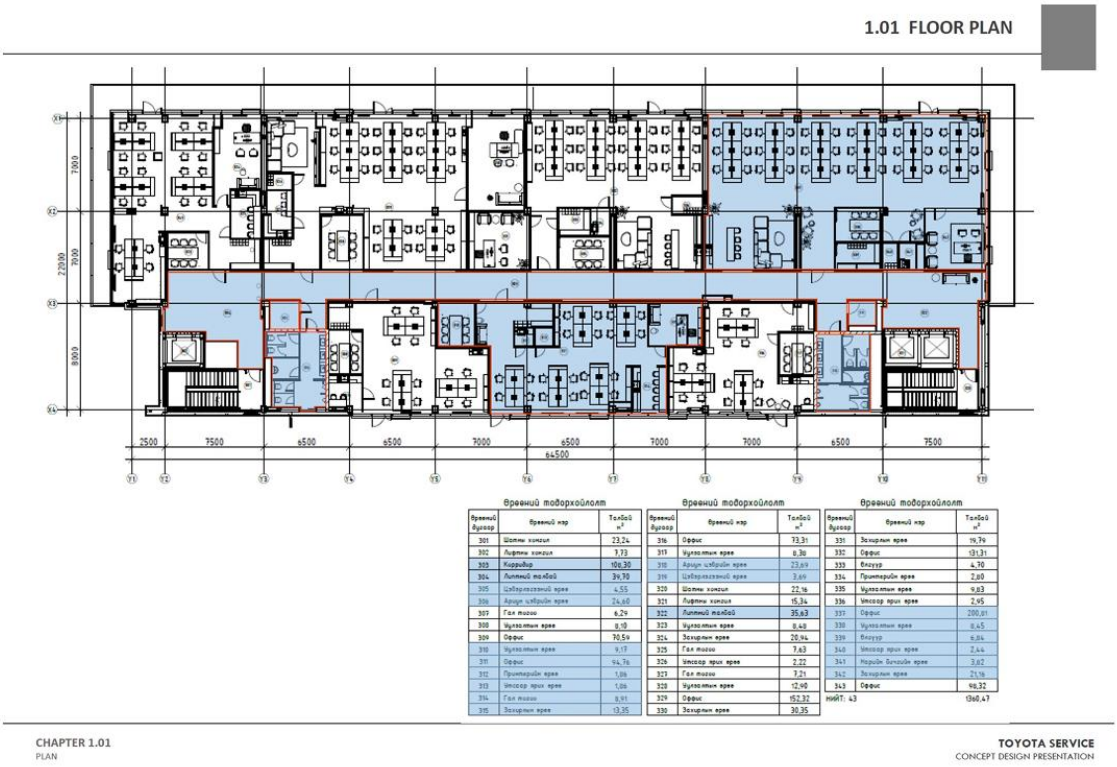

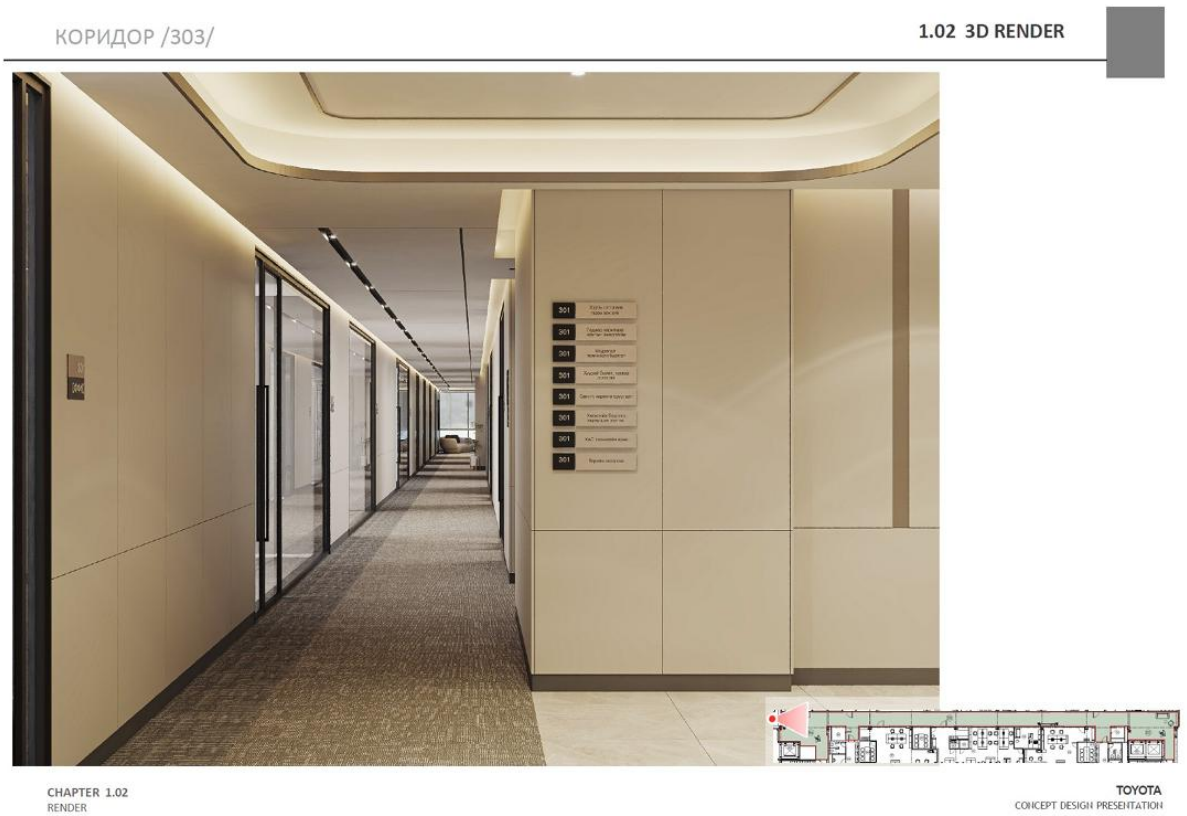

306. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ

1.02 3D RENDER







306. АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ


1.02 3D RENDER





311. ОФФИС


1.02 3D RENDER

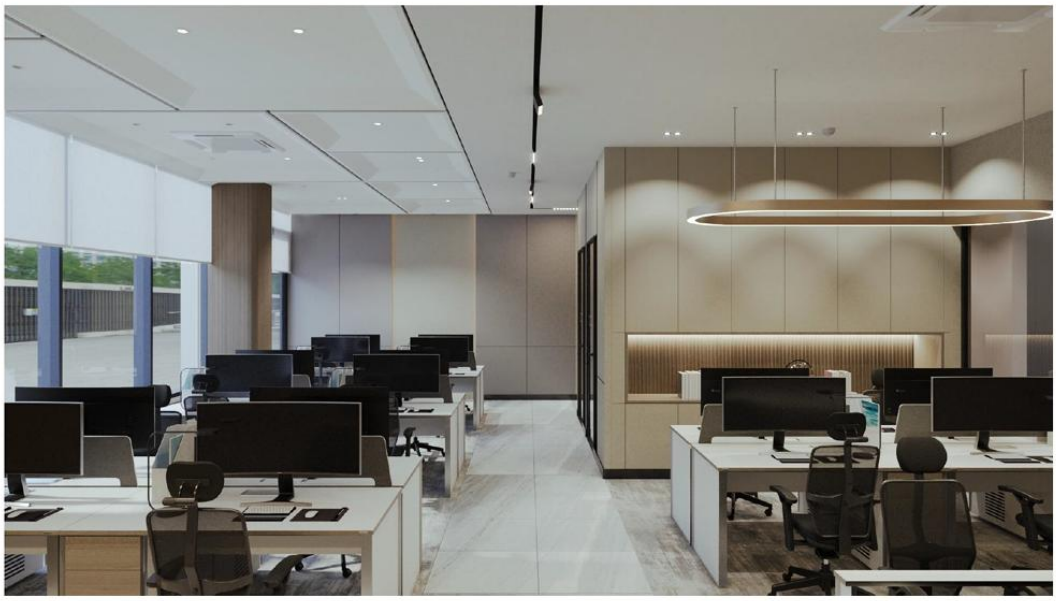



311. ОФФИС


1.02 3D RENDER

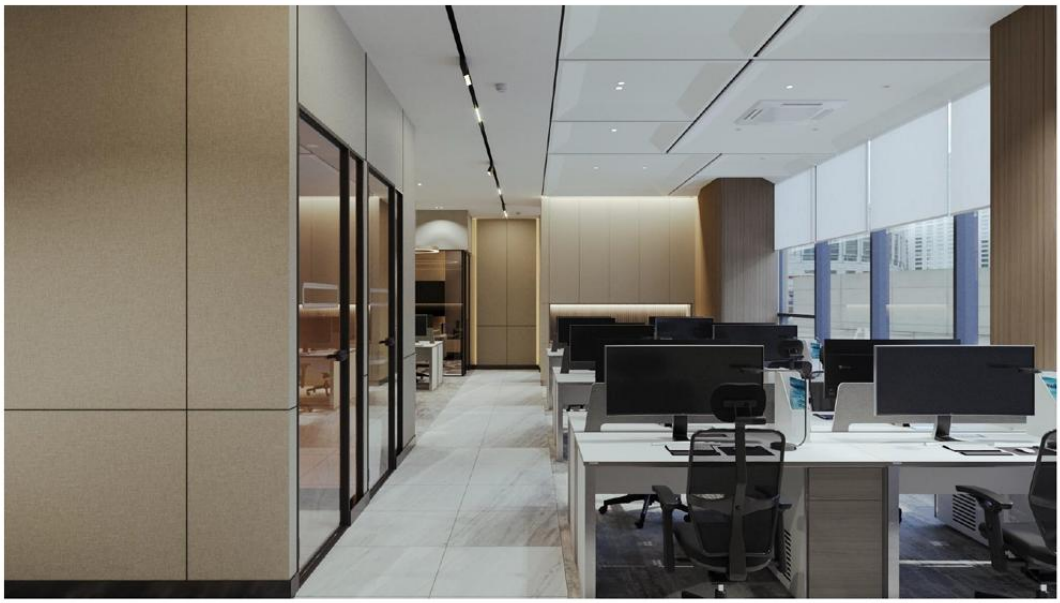




3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

6-р давхар

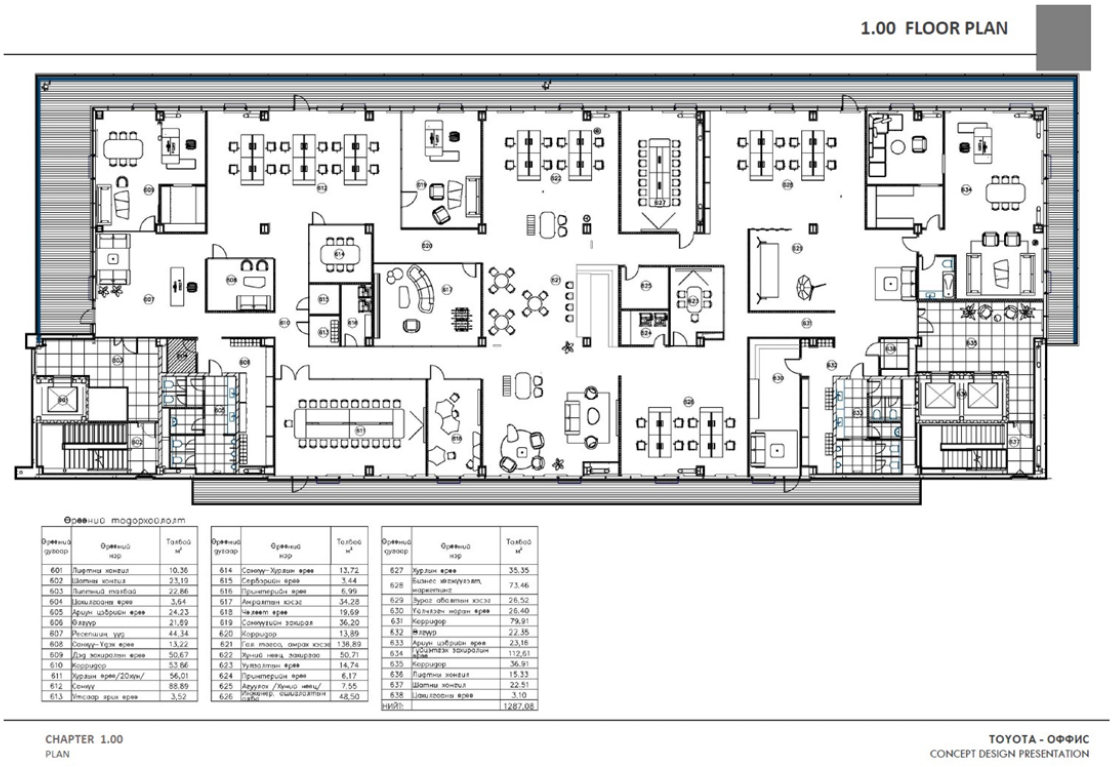

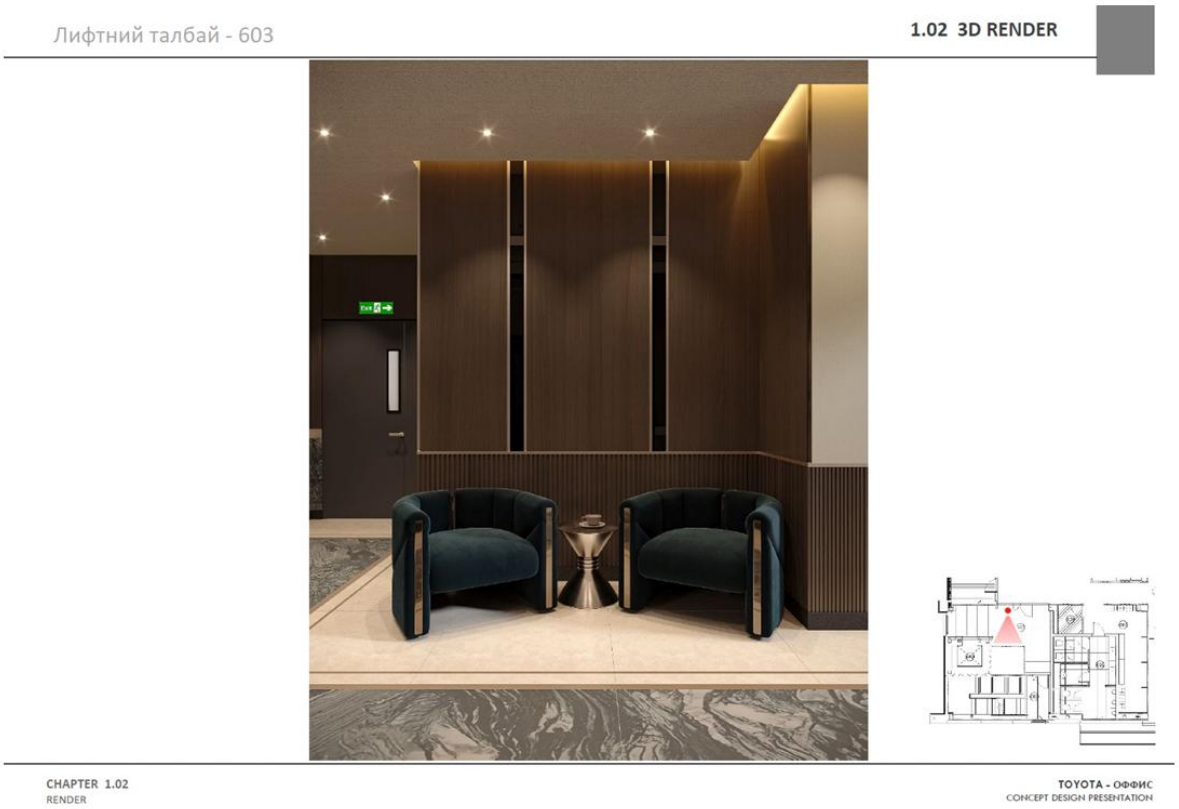

Ариун цэврийн өрөө - 605

1.02 3D RENDER



Ариун цэврийн өрөө - 605

1.02 3D RENDER



Санхүү - 612

1.02 3D RENDER



CHAPTER 1.02
RENDER

TOYOTA - LEXUS
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

Хүний нөөц, захиргаа – 622

1.02 3D RENDER



CHAPTER 1.02
RENDER

TOYOTA - ОФФИС
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

Гүйцэтгэх захирлын өрөө- 634

1.02 3D RENDER



Гүйцэтгэх захирлын өрөө- 634


1.02 3D RENDER



3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

7-р давхар

3.01 FLOOR PLAN

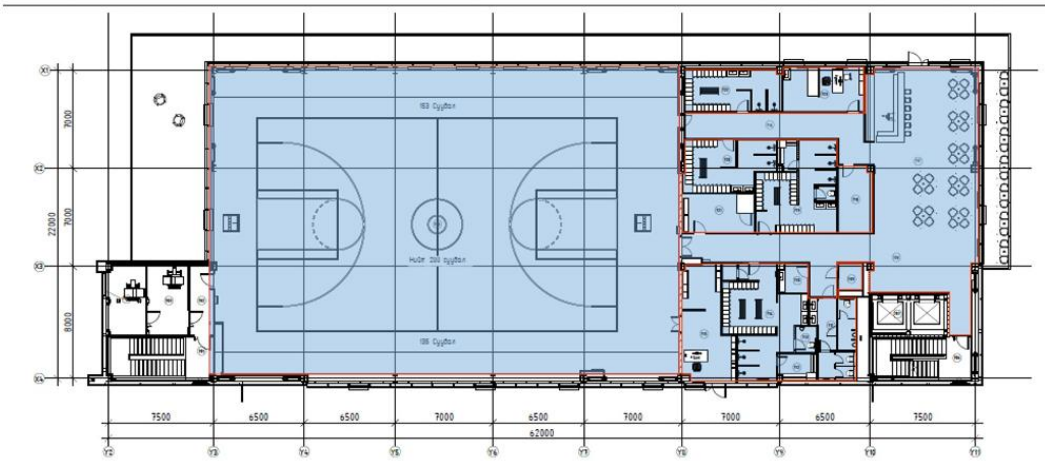

Өрөөний тодорхойлолт

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м²
701	Шатны хонгил	23,42
702	Шатны талбай	8,37
703	Техникийн өрөө	14,33
704	Техникийн өрөө	14,28
705	Спорт заал	750,52
706	Шатны хонгил	22,35
707	Лифтны хонгил	16,45
708	Коридор	67,51
709	Шүхлэлтэнд өрөө	3,06
710	Цэвэрлэгээний өрөө	4,20
711	Ариун цэврийн өрөө	16,59
712	Цэвэрлэгээний өрөө	5,08

Өрөөний тодорхойлолт

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м²
713	Ариун цэврийн өрөө	2,76
714	Хувцас солих өрөө /Эр/	34,77
715	Багш нарын өрөө	26,61
716	Коридор	27,43
717	Жүүс бааз	92,59
718	Вакуум	11,25
719	Хувцас солих өрөө /Эм/	33,58
720	Тамирчин хувцас солих /Эр/	21,67
721	Угаалгын өрөө	14,21
722	Тамирчин хувцас солих /Эм/	19,39
723	Энгийн өрөө	18,74
НИЙТ: 23		1250,00


CHAPTER 1.01
PLAN

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

705. СПОРТ ЗААЛ

3.02 3D RENDER






CHAPTER 1.01
RENDER

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

717. ЖУУС БААР

3.02 3D RENDER






717. ЖУУС БААР

3.02 3D RENDER






3D РЕНДЕР ЗУРАГ:

8-р давхар

4.01 FLOOR PLAN

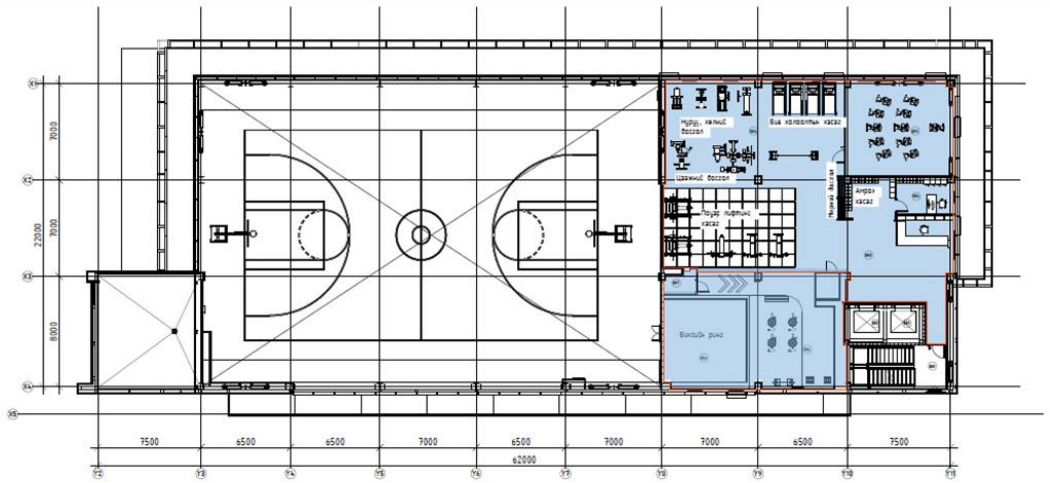

Өрөөний тодорхойлолт

Өрөөни...	Өрөөний нэр	Талбай...
801	Шатны хонгил	22,32
802	Лифтны хонгил	15,96
803	Фитнес заал	63,16
804	Багшийн өрөө	10,93
805	Спиннингийн өрөө	55,63
806	Боксын ринг	279,38
807	Цэвэрлэгээний өрөө	3,62
808	Цахилгааны өрөө	3,15


CHAPTER 1.01
PLAN

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

803. ФИТНЕС ЗААЛ /ХУВИЛБАР-1/


4.02 3D RENDER





CHAPTER 1.01
RENDER

TOYOTA SERVICE
CONCEPT DESIGN PRESENTATION

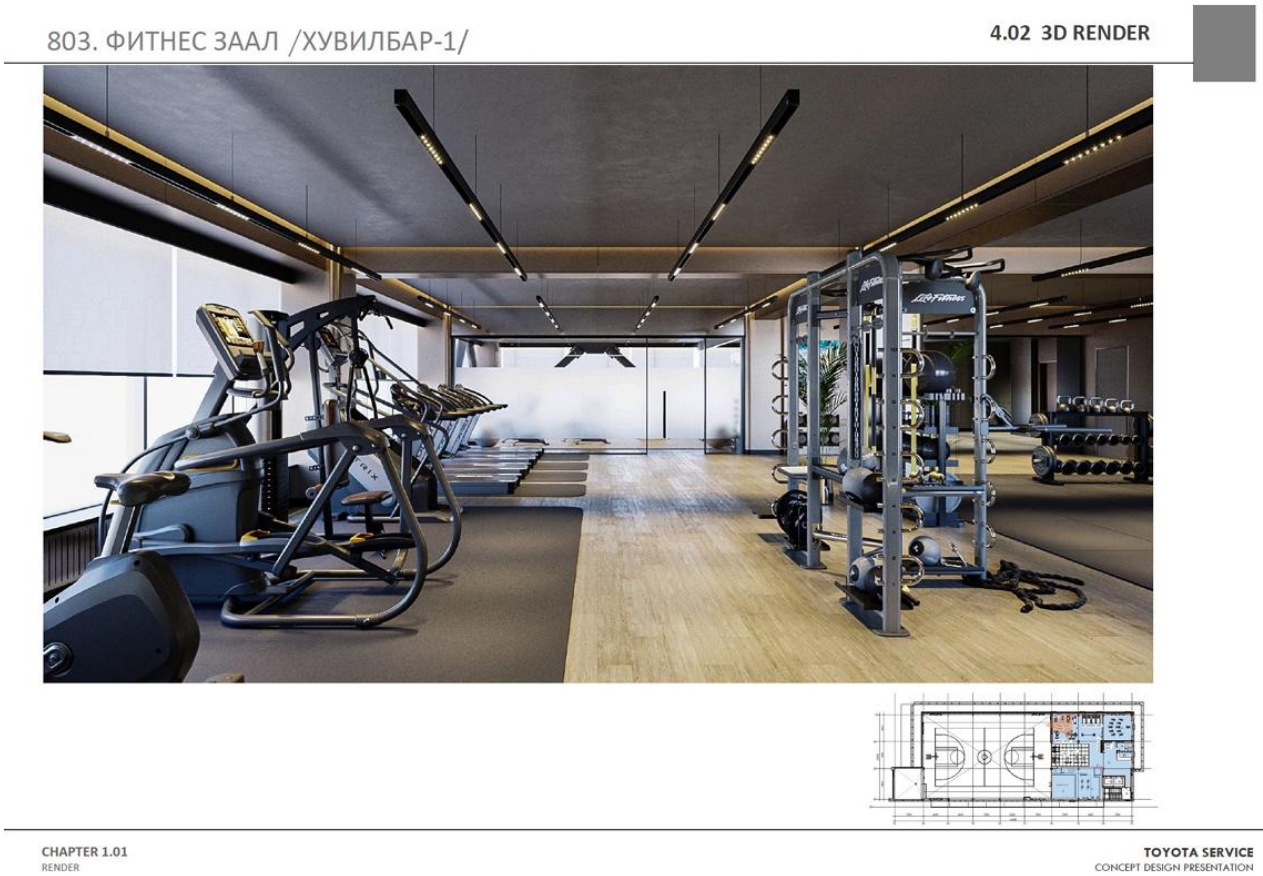

ТАЙЛАН ГАРГАСАН:

АХЛАХ ИНТЕРЬЕР ДИЗАЙНЕР ..... /Б.САНДАГДОРЖ/

ХЯНАСАН:

ЗАХИРАЛ ..... /Б.БИЛГҮҮН/

ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВСАН:

“ТАВАН БОГД” ХХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ:
...../Б.ЭНХСАЙХАН/
